

INFORME SEGUIMIENTO No. 6, año 2011
Obras de Valorización (Acuerdo 180 de 2005)

Fecha de Visita	30 de Junio de 2011	
Obras visitadas	4 puentes peatonales	- Avenida Centenario por Avenida Boyacá - Avenida Boyacá por calle 21 - Avenida Centenario por Avenida Ciudad de Cali - Avenida Ciudad de Cali por Avenida Centenario
Funcionario que realizó la visita	Diego Núñez, CCB	

A continuación se presenta el informe de la visita de campo cuyo objetivo es verificar el avance físico de las obras.

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Código de obra: 317 y 318
Tipo de obra: Puentes Peatonales
Lugar: (1) Avenida Boyacá por calle 21
 (2) Avenida Centenario por Avenida Boyacá
Contrato de obra: IDU-62-2009
Plazo estimado: 9 meses
Fecha de inicio: 25 de noviembre de 2009
Fecha fin inicial: 25 de agosto de 2010
Valor contrato: \$5.228.350.827
Contratista: Consorcio Infraestructura Puentes Centenario
Interventor: Consorcio Integrar

Según información presentada por el IDU en el comité de valorización realizado el día 30 de mayo en la Cámara de Comercio de Bogotá, los puentes peatonales de la Avenida Boyacá con calle 21 y de la Avenida Centenario con Avenida Boyacá deben estar terminados en junio de 2011.

Actualmente se encuentra instalada la estructura metálica de los puentes peatonales y se construyeron las rampas y las escaleras de acceso en ambos costados. En los dos proyectos se evidenció que está en proceso la construcción del espacio público en el costado oriental; sin embargo, al momento de la visita, no se observó presencia de trabajadores en el costado occidental de las obras donde también se construirá el respectivo espacio público.

Imágenes 1 y 2. Avance puente peatonal Avenida Boyacá con calle 19



Fuente: Dirección de Proyectos y Gestión Urbana. Visita realizada el 30 de junio de 2011.

Imágenes 3 y 4. Avance puente peatonal Avenida Centenario con Avenida Boyacá




Fuente: Dirección de Proyectos y Gestión Urbana. Visita realizada el 30 de junio de 2011.

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Código de obra:	314 y 315
Tipo de obra:	Ciclopuentes
Lugar:	(1) Avenida Ciudad de Cali por Avenida Centenario Occidente. (2) Avenida Centenario por Avenida Ciudad de Cali Norte
Contrato de obra:	IDU-37-2009
Plazo estimado:	8 meses
Fecha de inicio:	24 de noviembre de 2009
Fecha fin inicial:	24 de julio de 2010
Valor contrato:	\$4.760.244.915
Contratista:	Consortio Peatonales Centenario
Interventor:	Consortio CRA-Diego Fonseca

Según información presentada por el IDU en el comité de valorización realizado el día 30 de mayo en la Cámara de Comercio de Bogotá, el ciclopunte de la Avenida Ciudad de Cali por Avenida Centenario Occidente se debe entregar en el mes de agosto de 2011, mientras que el ciclopunte de la Avenida Centenario por Avenida Ciudad de Cali Norte debe estar terminado en septiembre de 2011.

Imágenes 5 y 6. Avance de obra ciclopunte Avenida Ciudad de Cali

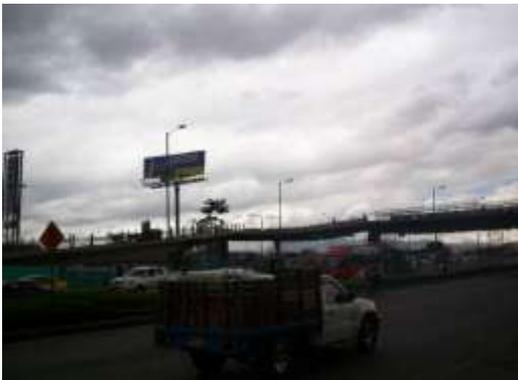

Fuente: Dirección de Proyectos y Gestión Urbana. Visita realizada el 30 de junio de 2011.

Actualmente se encuentra instalada la estructura del ciclopunte de la Avenida Ciudad de Cali y se está realizando la conexión con la cicloruta en el costado oriental.

En el costado occidental se realizó la excavación y cimentación del terreno donde se dará continuidad a la cicloruta que conecta con el siguiente ciclopunte; sin embargo, al momento de realizar la visita, no se observó presencia de trabajadores en esta zona.

Por su parte, para el ciclopunte de la Avenida Centenario apenas se está realizando la construcción de los pilotes de la parte central y sur, mientras que en el costado norte ya se ha levantado parte de la estructura.

Imágenes 7 y 8. Avance de obra ciclopunte Avenida Centenario



Fuente: Dirección de Proyectos y Gestión Urbana. Visita realizada el 30 de junio de 2011.

ALERTAS:

- ⚠️ Teniendo en cuenta que los puentes peatonales de la Avenida Boyacá debían entregarse en el mes de junio, se evidencia un retraso frente a los cronogramas estimados por el IDU; por tanto, se requerirá una nueva ampliación en los plazos de ejecución.
- ⚠️ Se verificó que, tal como se mencionó en el comité de valorización, sólo se está instalando el adoquín que permite el acceso a los puentes peatonales de la Avenida Boyacá, quedando pendiente la terminación del espacio público en el resto del área. Al respecto, la CCB envió un comunicado al IDU el día 23 de junio de 2011 haciendo un llamado para que se busque una solución a dicha situación y se garantice la construcción de la totalidad del espacio público que requieren estas obras. Está pendiente la respuesta por parte del IDU.
